

ALLEGATO "A"

Comune di Stresa

Provincia di VB

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Ristrutturazione Bagni Pubblici - Piazzale Sant'Ambrogio.-

COMMITTENTE: COMUNE DI STRESA.

CANTIERE: Piazzale Sant'Ambrogio, Stresa (VB)

Stresa, 16/12/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA



IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento RUP Rizzato Marina)

Geometra Longoni Paolo

Piazza Cadorna n.36
28838 Stresa (VB)
Tel.: 0323/933770 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: info@longonistresa.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	19/01/2026	19/01/2026
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1	20/01/2026	20/01/2026
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	20/01/2026	20/01/2026
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	1	1	21/01/2026	21/01/2026
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere	3	1	1	21/01/2026	21/01/2026
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere	2	1	1	22/01/2026	22/01/2026
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere	3	1	1	22/01/2026	22/01/2026
DEMOLIZIONI GENERALI E TAGLI					
Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici	1	3	5	23/01/2026	27/01/2026
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici	1	3	3	28/01/2026	30/01/2026
MURATURE ESTERNE					
Installazione di ponteggio metallico fisso	8	2	2	02/02/2026	03/02/2026
Preparazione malta	1	5	7	04/02/2026	10/02/2026
Esecuzione di murature esterne in laterizio	1	5	7	04/02/2026	10/02/2026
REALIZZAZIONE SOLAI IN LATERO-CEMENTO DI COPERTURA					
Esecuzione di cassatura con tavolame in legno di strutture orizzontali	1	3	3	11/02/2026	13/02/2026
Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture orizzontali in c.a. o miste	1	2	2	16/02/2026	17/02/2026
Getto in calcestruzzo per strutture orizzontali	1	2	2	18/02/2026	19/02/2026
Disarmo opere in c.a.	1	1	1	20/02/2026	20/02/2026
OPERE IN COPERTURA: POSA ORDITURA PRINCIPALE E COPERTURA					
Impermeabilizzazione di coperture	1	2	2	23/02/2026	24/02/2026
Posa in opera di copertura isolata	1	3	3	25/02/2026	27/02/2026
Realizzazione di opere di lattoneria	2	2	2	02/03/2026	03/03/2026
Montaggio di copertura in lamiera grecata	1	3	3	04/03/2026	06/03/2026
OPERE INTERNE: TAVOLATI, INTONACI					
Preparazione malta	1	5	5	09/03/2026	13/03/2026
Realizzazione di pareti divisorie	1	5	5	09/03/2026	13/03/2026
Posa di intonaci interni	1	5	5	16/03/2026	20/03/2026
IMPIANTI: ELETTRICO, RISCALDAMENTO, IDRICO-SANITARIO					
Realizzazione di fori passanti, tracce, ecc. in muri e solai	1	3	3	23/03/2026	25/03/2026
Posa in opera dell'impianto idrico-sanitario	2	4	6	26/03/2026	31/03/2026

Tabella Analitica Gantt

				026	026
Posa in opera dell'impianto termico autonomo	2	3	3	01/04/2026	03/04/2026
Posa in opera dell'impianto elettrico interno	3	6	8	06/04/2026	13/04/2026
Chiusure di tracce e fori in solai e murature	1	4	4	14/04/2026	17/04/2026
FINITURE ESTERNE: CAPPOTTO, POSA DI RINGHIERE, INTONACI, SERRAMENTI, TINTEGGIATURA, ECC.					
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	5	5	5	20/04/2026	24/04/2026
Posa in opera di serramenti	4	4	4	27/04/2026	30/04/2026
Formazione di massetto per esterni	1	2	2	04/05/2026	05/05/2026
Posa di pavimenti per esterni	6	3	3	06/05/2026	08/05/2026
Tinteggiatura di superfici esterne	5	3	3	11/05/2026	13/05/2026
Smontaggio di ponteggio metallico fisso	8	2	2	14/05/2026	15/05/2026
FINITURE INTERNE					
Formazione del fondo per la posa di pavimenti	6	3	3	18/05/2026	20/05/2026
Formazione di fondo per rivestimenti interni	6	2	2	21/05/2026	22/05/2026
Posa pavimenti interni	6	5	5	25/05/2026	29/05/2026
Posa rivestimenti interni	5	9	12	01/06/2026	12/06/2026
Tinteggiatura di superfici interne	5	5	5	15/06/2026	19/06/2026
Posa di serramenti interni	4	3	3	22/06/2026	24/06/2026
SMOBILIZZO CANTIERE					
SMOBILIZZO CANTIERE	1	2	2	25/06/2026	26/06/2026

LEGENDA:

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Edile

2) = Idraulico - Lattoniere

3) = Elettricista

4) = Serramentista

5) = Verniciatore


6) = Piastrellista

7) = Fabbro

8) = Nolo Ponteggio

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

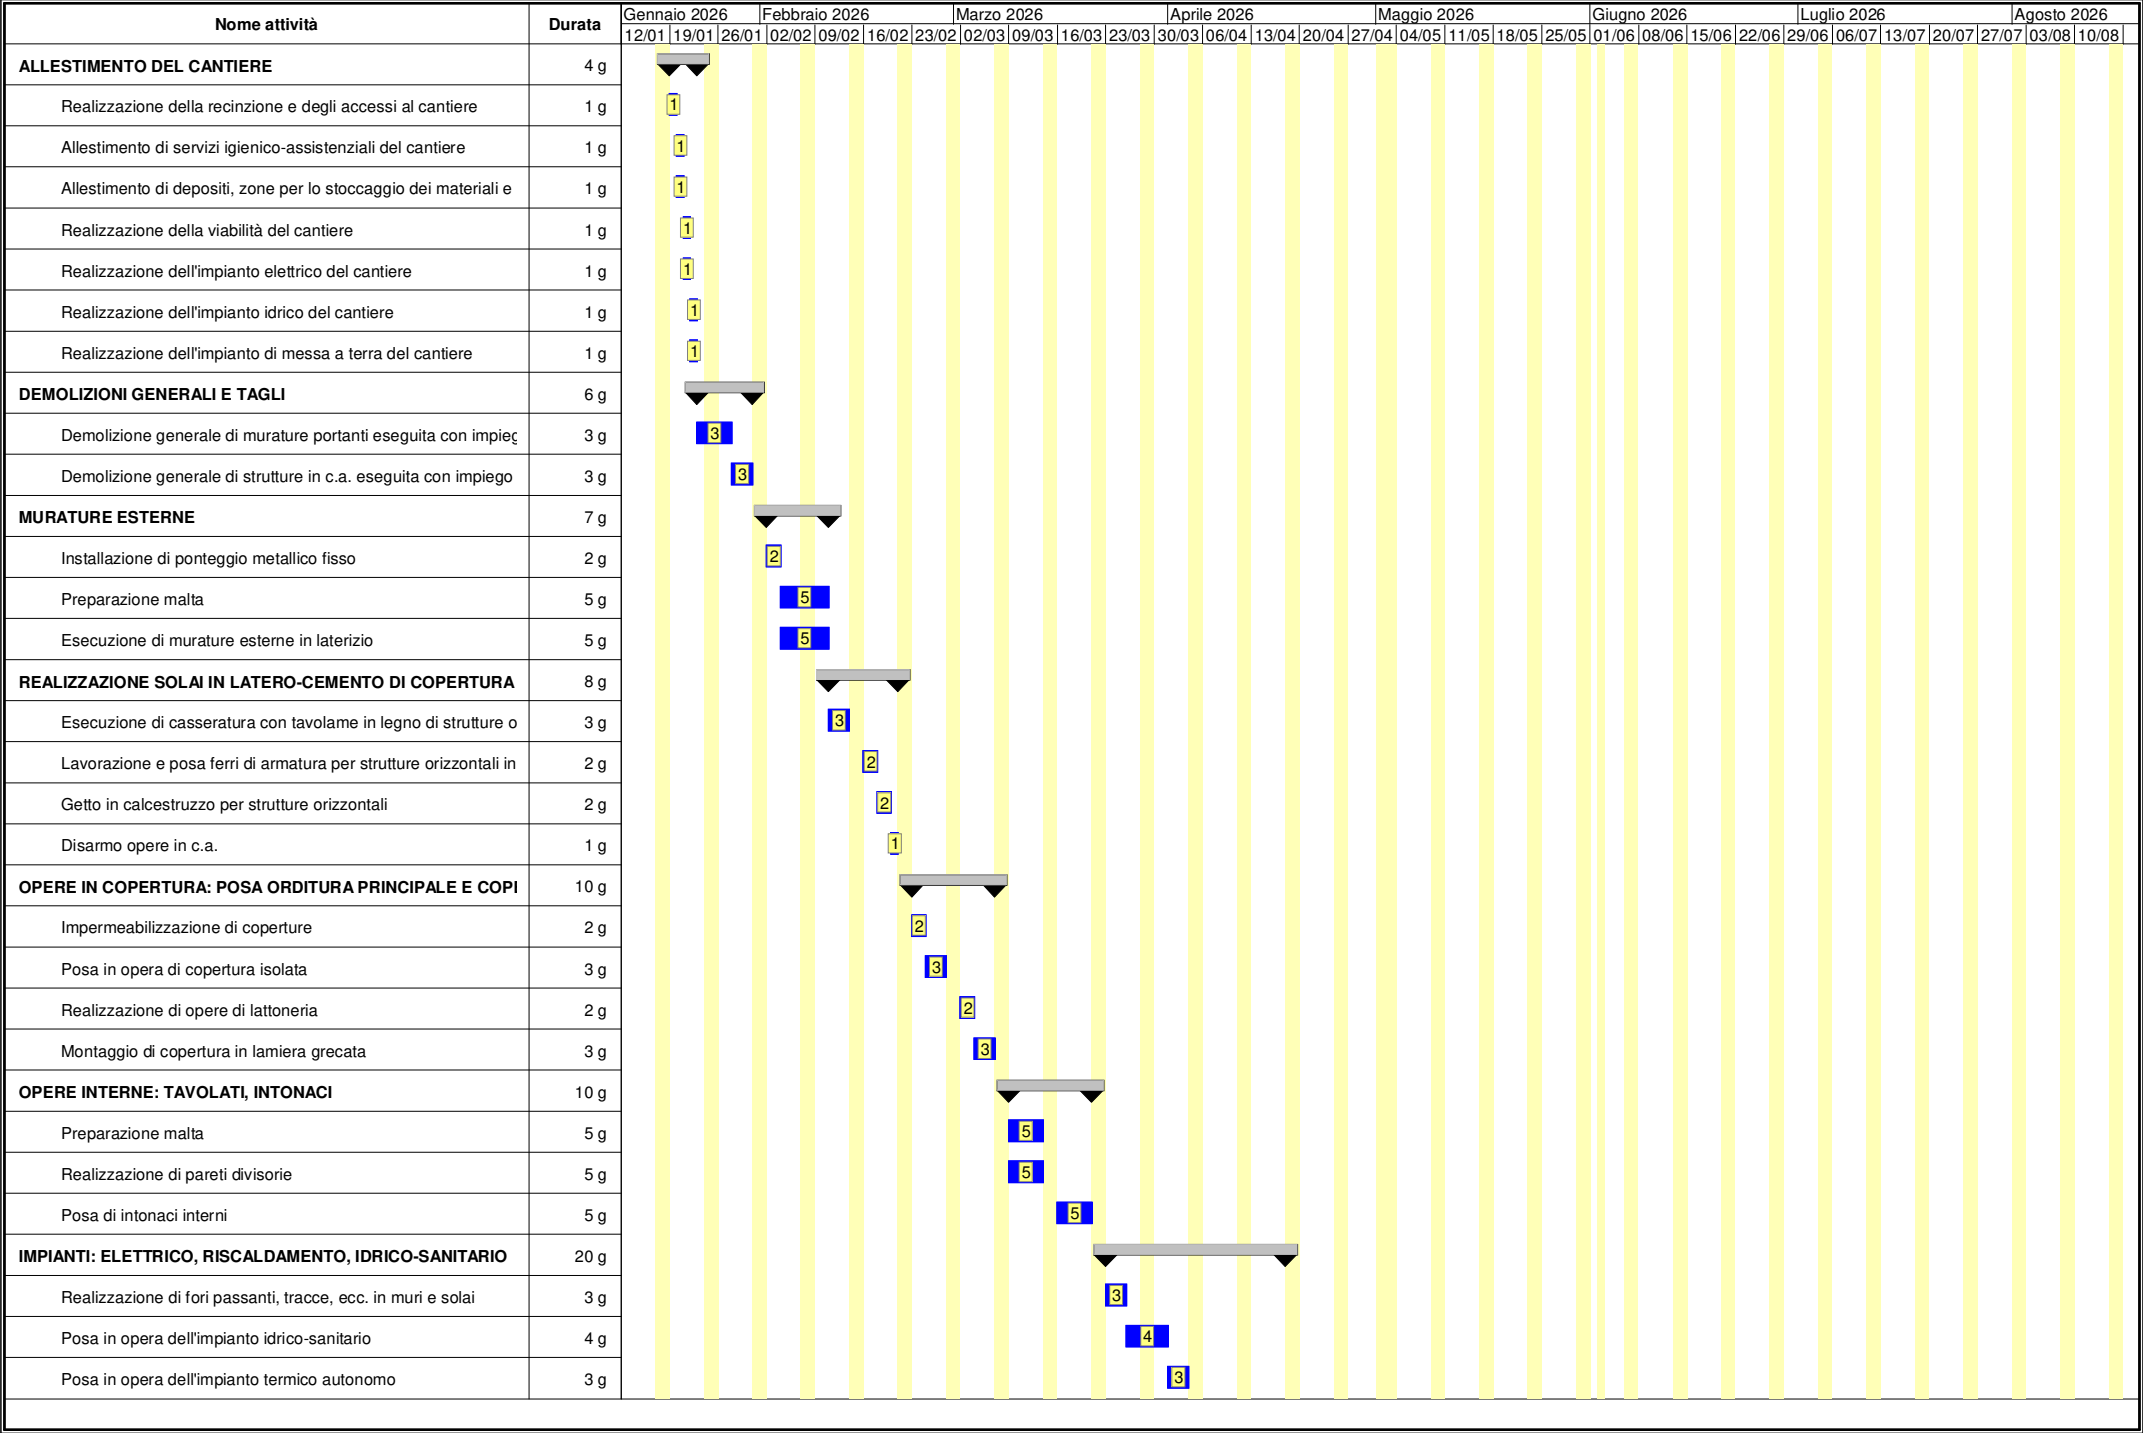

[illegible]
